

Dashboard de Planeación y Control de Proyecto Industrial

Mes

Todas

Estado

Todas

Actividad

Todas

\$410.000

Presupuesto Planeado

\$427.000

Presupuesto Ejecutado

0,04

Variación Presupuest...

52,17


Avance Ejecutado %

0,83


% Actividades en Riesgo

Evolución del Presupuesto del Proyecto

Planeado vs Ejecutado en el tiempo

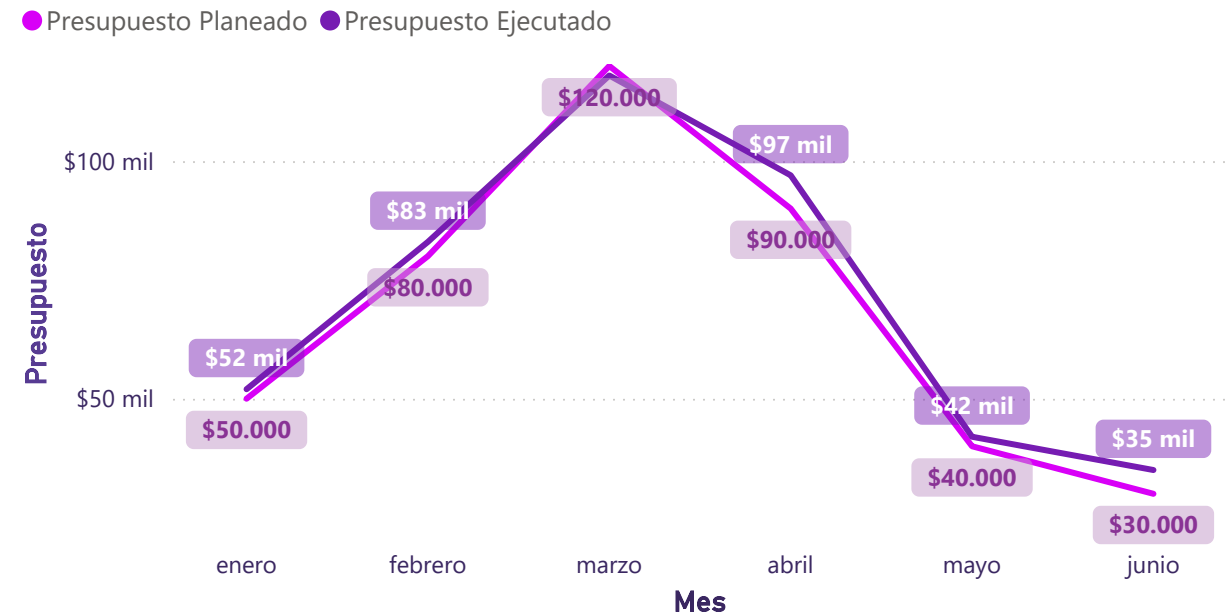

Avance Planeado vs Ejecutado por Actividad

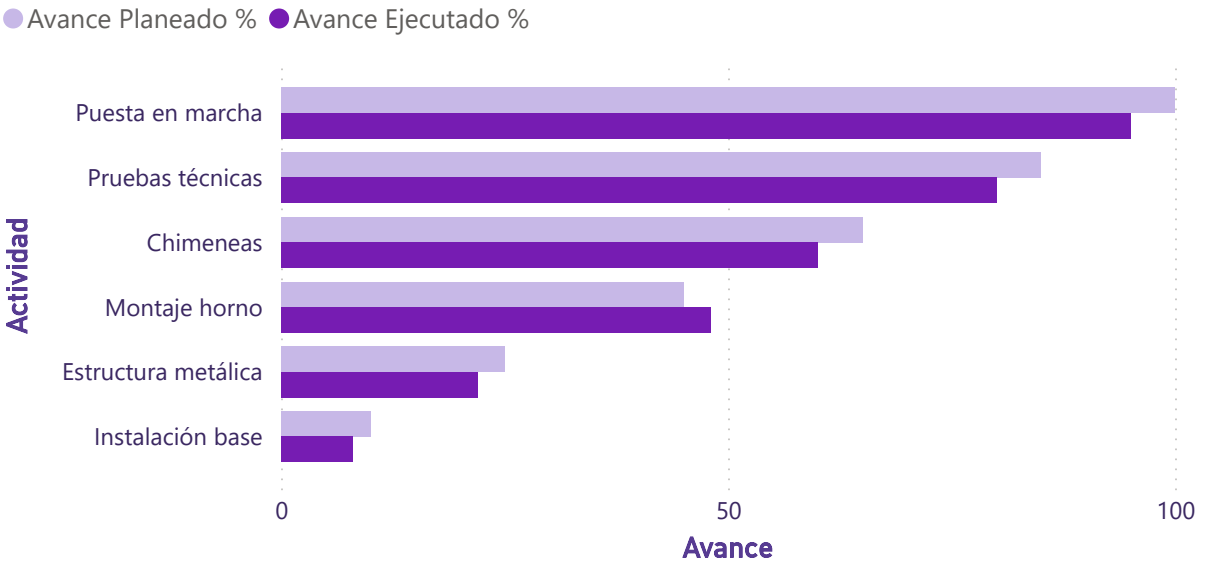

Control Operativo del Proyecto

Actividad	Responsable	Estado	Avance Ejecutado %	Variación Presupuesto %
Puesta en marcha	Producción	Crítico	95,00	0,17
Pruebas técnicas	Calidad	Atrasado	80,00	0,05
Montaje horno	Hornos	En tiempo	48,00	-0,02
Instalación base	Hornos	Atrasado	8,00	0,04
Estructura metálica	Ingeniería	Atrasado	22,00	0,04
Chimeneas	Obra civil	Atrasado	60,00	0,08
Total			52,17	0,04

Insights del Proyecto

- El proyecto presenta una **desviación presupuestal positiva del 4 %**, evidenciando un **sobrecosto controlado**, principalmente asociado a actividades críticas en la fase final de ejecución.
- El **avance físico ejecutado (52,17 %)** se encuentra **por debajo del avance planificado**, lo que indica **riesgos en el cumplimiento del cronograma**, especialmente en actividades operativas clave.
- Se identifica un **83 % de actividades en riesgo**, concentradas en procesos de **obra civil, calidad y producción**, lo que incrementa la probabilidad de impactos en tiempo y costos si no se implementan acciones correctivas.
- Actividades como **Puesta en Marcha y Pruebas Técnicas** presentan **altos niveles de avance**, pero con **variaciones presupuestales significativas**, reflejando una presión operativa en la etapa de cierre del proyecto.
- La evolución mensual del presupuesto muestra una **ejecución intensiva entre febrero y abril**, seguida de una desaceleración, lo que sugiere una **redistribución de recursos no alineada al avance real**.
- El análisis integrado de costo, tiempo y avance evidencia la necesidad de **reforzar el control operativo y la planificación detallada por actividad** para mitigar riesgos de sobrecostos futuros.
